

内野工区

○概要

場所：十津川内野
 崩壊地面積：4.79ha
 主要工種：谷止工、山腹工
 工期：令和6年6月8日から
 令和7年3月7日まで
 令和7年2月28日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



R6施工箇所
 ソイル注入マット伏工
 かご枠土留工



令和7年3月現在

凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画

完成 (R7.3月)



野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 4月24日から

令和 7年 3月 7日まで

令和 7年 3月 7日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

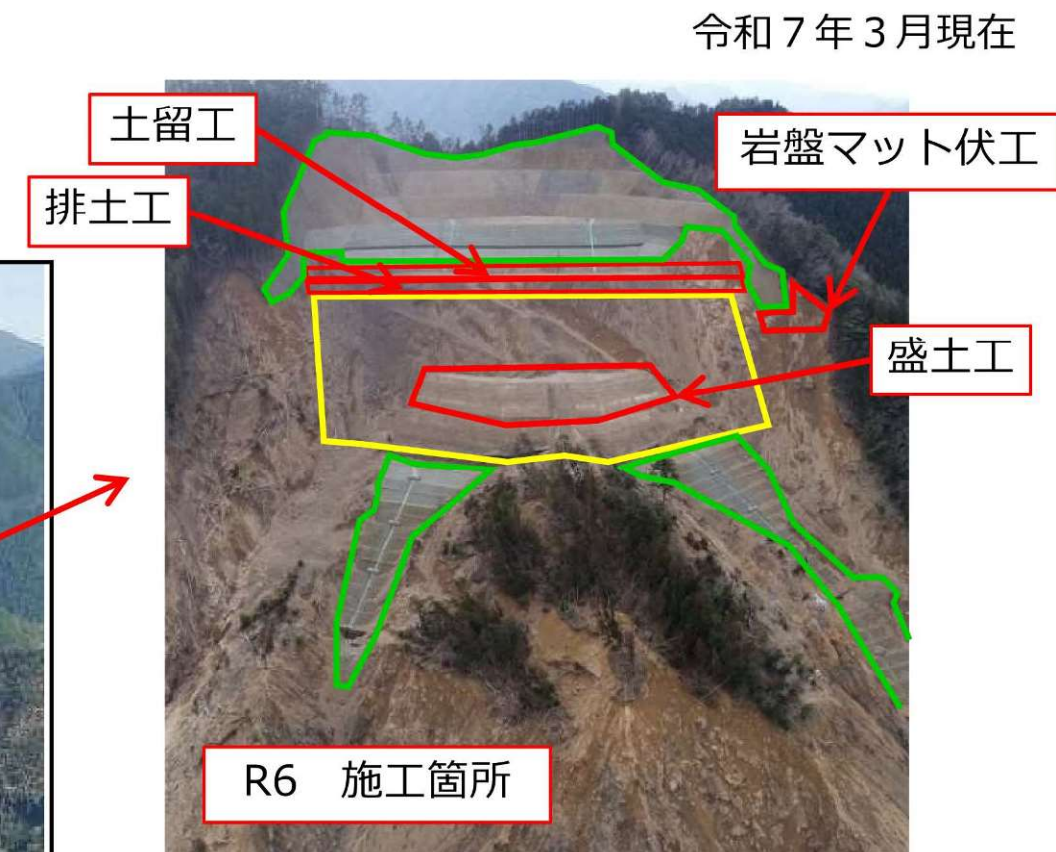

令和7年3月現在

山崎谷工区(2号地)

〇概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 7月 4日から
令和 7年 3月 7日まで
令和 7年 3月 7日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

〇位置



〇復旧状況



山腹崩壊の状況

R6施工
簡易吹付法枠工



完成 (R7.3月)



流路工 完成 (R7.3月)



コンクリート谷止工 完成 (R7.3月)

凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 5月30日から
令和 7年 3月 7日まで
令和 7年 2月28日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。


○位置



○復旧状況

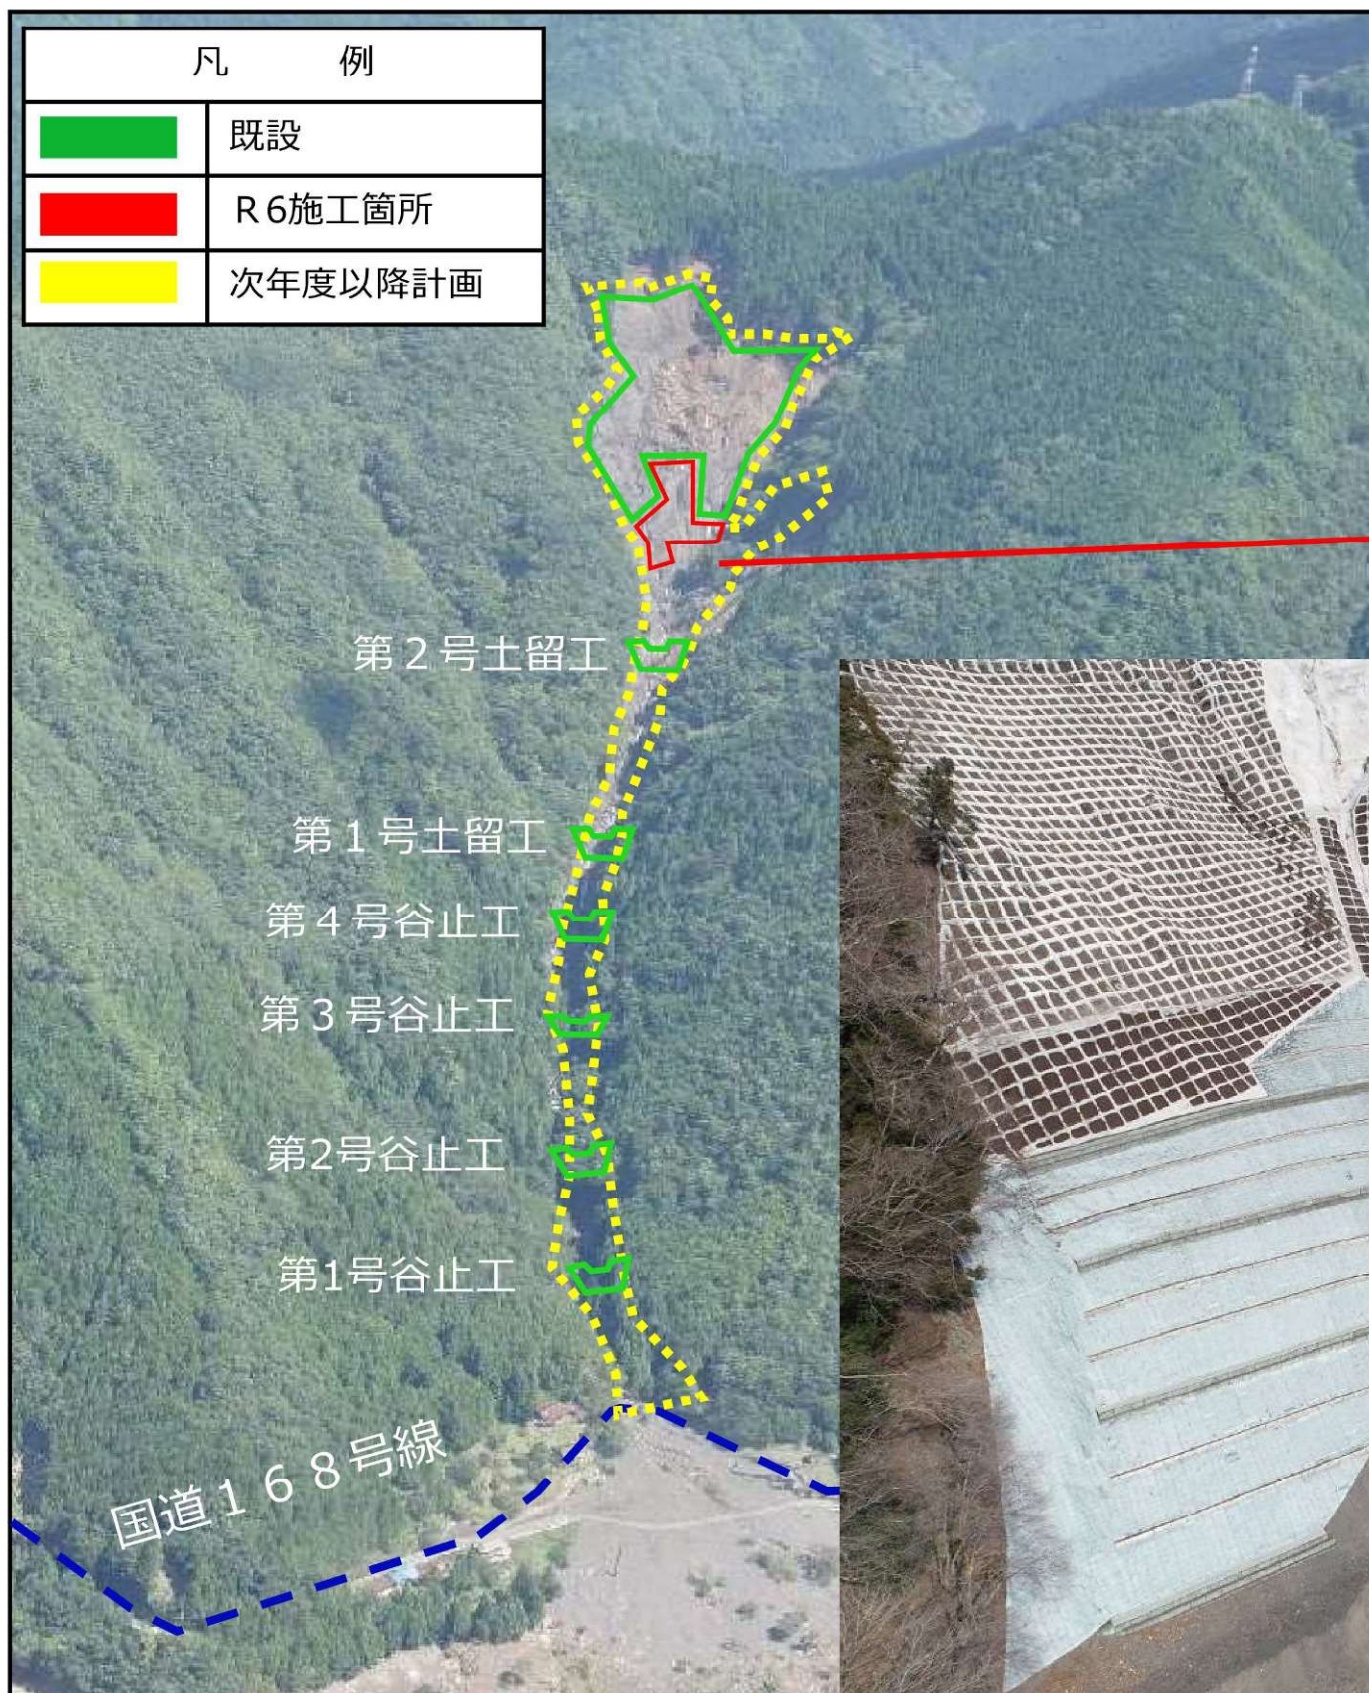

R6施工箇所
簡易法枠吹付工・植生マット伏工・土留工 3基

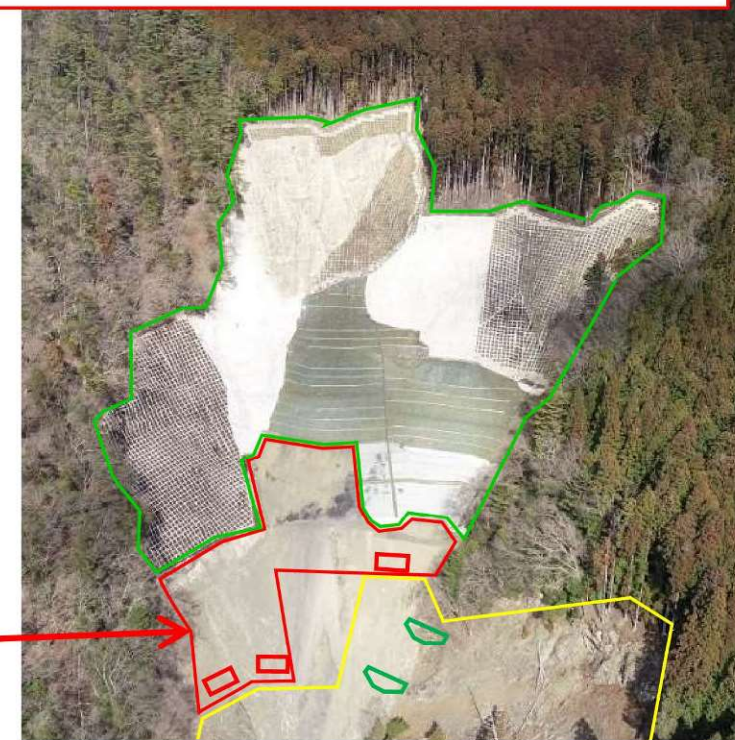

完成 (R7.3月)
