

令和元年6月21日
林野庁
近畿中国森林管理局
石川森林管理署

手取川上流大汝^{おおなんじ}国有林崩壊地対策工事の
実施状況について

林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署が実施しております、手取川上流大汝国有林における今年度の工事が完了しましたのでお知らせいたします。

手取川上流大汝国有林における崩壊地対策については、令和元年6月13日に工事に着手し、ヘリコプターによる航空緑化導入工、航空コア緑化工の施工に取り組んできました。

このような中、6月20日に今年度の工事が完了しましたのでお知らせいたします。（詳細は別紙のとおり）



【問い合わせ先】

林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署
次長 篠原庄次
〒920-1158
石川県金沢市朝霧台2-21
電話：050-3160-6100
FAX：076-222-6215

令和元年度対策の実施状況について

6 / 13に工事着手し、航空緑化導入工（対策①）、航空コア緑化工（対策②）を実施し、6 / 20に今年度の工事が完了。

対策①

- ・航空緑化導入工
（緑化導入工A）在来種子、肥料等の散布



対策②

- ・航空コア緑化工A（500袋）
（水溶紙製容器、種子、肥料等）
- ・航空コア緑化工B（300袋）
（麻袋にヤナギ、赤玉土）

撮影：令和元年6月20日（石川森林管理署）

(参考) 令和元年度対策の施工状況について

■ 航空緑化導入工 (対策①)

技術検討会の指摘等を踏まえ、白山の生態系に配慮し崩壊地周辺に自生している植物を活用した緑化（緑化工A）を実施。

※（緑化導入工A）昨年採取した種子、肥料等を混ぜて泥状にして散布




【昨年10月の種子採取状況】
（石川県立大、環境省、白山市と合同実施）



【種子の精選】



【種子、肥料等を混ぜて泥状に】

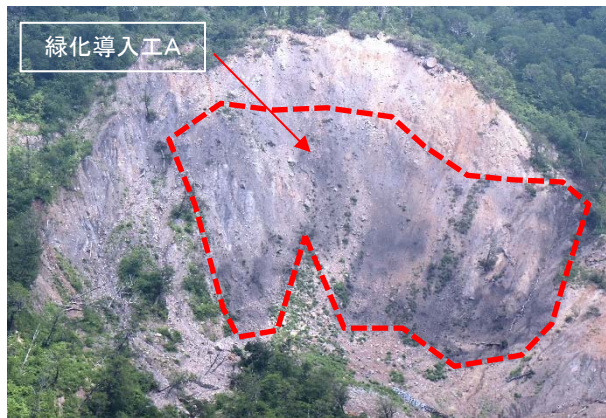

【緑化資材散布後の状況】



【ヘリコプターによる運搬】



■ 航空コア緑化工 (対策②)

（コアA）昨年施工した袋型石詰筋工の上部を中心に種子、肥料等入りの水溶紙製容器を散布。（500袋）

（コアB）ヤナギの挿し木、赤玉土入りの麻袋を湿潤部に散布。（300袋）



【水溶性容器散布後の状況】



【湿潤部への麻袋散布後の状況】
