


[illegible][illegible]

3. 迴排水

表流水は流路を土のう積で締め切り、箱樋で廻排水する。また、床掘内の湧水等は排水ポンプを利用して排水する。

箱樋 L=10m (巾50cm×深20cm、集水面積15ha未滿)

土のう積 2.1m² (H=0.3m、L=7.0m、集水面積10ha以下)

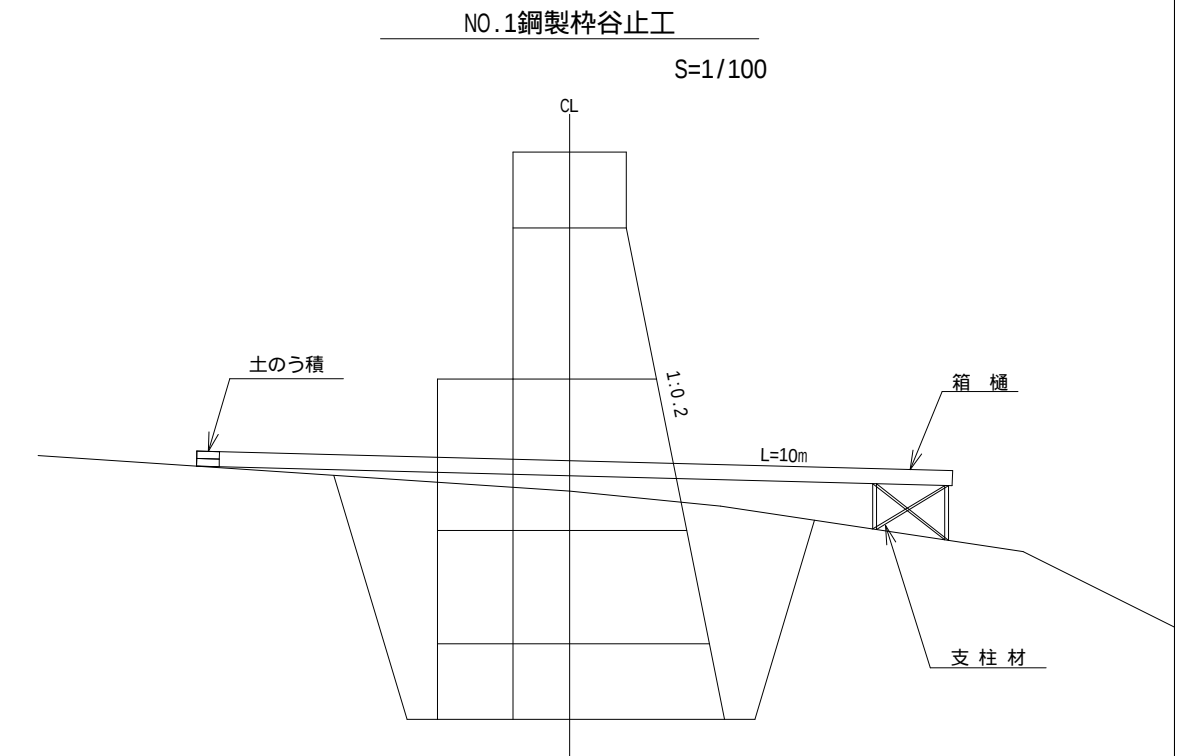

1. 運搬工

重機の搬入及び資材等の運搬は、市道から開設する重機道を利用する。

- 重機道 $L = 235\text{m}$ (全幅員3.0m)
 - 不陸均し $V = 50 \times 0.3 = 15\text{m}^3$ (0.3m³/m)
 - 掘削量 $V = 56 \times 0.5 + 70 \times 1.0 + 59 \times 0.4$
 $= 121.6\text{m}^3$
 - 盛土量 $V = 56 \times 0.3 + 70 \times 1.2 + 59 \times 0.5$
 $= 130.3\text{m}^3$

2. 敷鉄板

既設市道および重機道手前の施工ヤードに鉄板を敷設する。

敷鉄板1枚当り規格：(面積9.29m²、22×1,524×6,096、1,604kg)

- ・既設市道 敷鉄板枚数 = 254枚
- ・施工ヤード 敷鉄板枚数 = 11枚

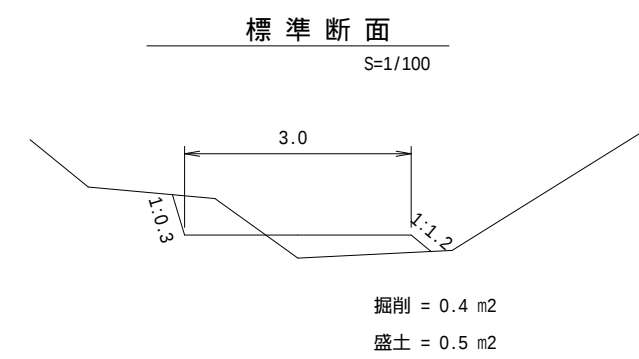
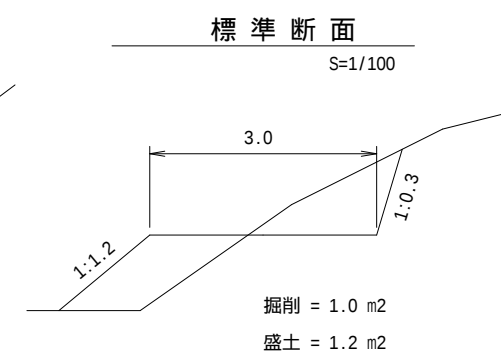
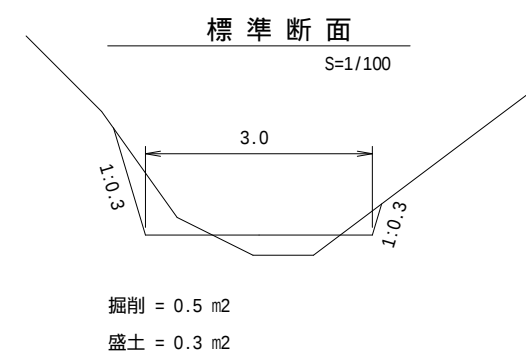


図 面 名	仮 設 計 画 図		
図 面 番 号		縮 尺	図 示

0 5 10
