

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	秋田森林管理署	
物件番号	3号	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(長内沢国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量										最寄り市町村 からの距離 km	備 考								
									本数	材積 m³	m³/m	N	L	計	伐倒		集・運材		小運搬				巻立				森林作業道開設		林地保全		土場 作 設等 h	砂利 数量 m³	実割 (%) 取 引	鉄板 規格・枚数
															方法	数量 m	方式	数量 m	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m	クラフツ付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m	数量 m	林地傾 斜 緩・中・急			延長 m	2種 編組 m	緑化 m					
3060い	水涵保	秋田スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.33	25	26	439	321	0.73	144	0	144	全木	321	プロセッサ	144	1,165	144	5,400	144	144	中							仙北市役所 田沢湖庁舎	11.3		
3060い1	水涵保	秋田スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.80	25	26	342	248	0.72	110	0	110	全木	248	プロセッサ	110	1,111	110	5,400	110	110	緩							〃	11.2		
3060い2	水涵保	秋田スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.79	25	26	339	246	0.73	110	0	110	全木	246	プロセッサ	110	875	110	5,400	110	110	中							〃	11.0		
3060ろ	水涵保	秋田スギ	94	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.25	25	28	46	42	0.92	19	0	19	全木	42	プロセッサ	19	813	19	5,400	19	19	中							〃	10.9		
3060は	水涵保	秋田スギ	72	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.08	25	24	509	312	0.61	143	6	149	全木	312	プロセッサ	149	625	149	5,400	149	149	緩							〃	10.7		
3060ほ	水涵保	秋田スギ	74	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.2	25	24	792	479	0.61	219	9	228	全木	479	プロセッサ	228	951	228	5,400	228	228	中							〃	11.1		
3060た	水涵保	秋田スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.96	25	20	2,186	920	0.42	389	11	400	全木	920	プロセッサ	400	1,362	400	5,400	400	400	中							〃	11.5		
3060た1	水涵保	秋田スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.33	25	20	853	360	0.42	152	4	156	全木	360	プロセッサ	156	770	156	5,400	156	156	中							〃	10.9		
3060れ	水涵保	秋田スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.12	25	26	694	471	0.68	210	0	210	全木	471	プロセッサ	210	732	210	5,400	210	210	中							〃	10.8		
3060そ	水涵保	秋田スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.76	25	20	279	117	0.42	50	1	51	全木	117	プロセッサ	51	829	51	5,400	51	51	急							〃	10.9		
3060つ1	水涵保	秋田スギ	94	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.41	25	28	82	69	0.84	32	0	32	全木	69	プロセッサ	32	452	32	5,400	32	32	中					RC-0-80 60m	3m*10枚 190日 6m*10枚 190日	〃	10.6		
3060つ2	水涵保	秋田スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.19	25	26	706	480	0.68	213	0	213	全木	480	プロセッサ	213	607	213	5,400	213	213	中							〃	10.7		
3060つ4	水涵保	秋田スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.02	25	26	506	346	0.68	154	0	154	全木	346	プロセッサ	154	479	154	5,400	154	154	中							〃	10.6		
3060つ6	水涵保	秋田スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.08	25	26	350	238	0.68	106	0	106	全木	238	プロセッサ	106	190	106	5,400	106	106	中							〃	10.3		
3060ね4	水涵保	秋田スギ	94	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.81	25	28	164	135	0.82	61	3	64	全木	135	プロセッサ	64	349	64	5,400	64	64	中							〃	10.4		
3060ね6	水涵保	秋田スギ	94	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.43	25	30	205	173	0.85	86	0	86	全木	173	プロセッサ	86	591	86	5,400	86	86	緩							〃	10.7		
3060る1	水涵保	秋田スギ	95	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.60	25	30	108	98	0.91	48	0	48	全木	98	プロセッサ	48	1,325	48	4,400	48	48	中					RC-0-80 60m	3m*20枚 190日 6m*10枚 190日	〃	10.4		
3062に	水涵保	秋田スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.58	25	16	333	68	0.20	21	5	26	全木	68	プロセッサ	26	1,464	26	0	0	26	急							〃	10.5		
3062ほ	水涵保	秋田スギ	74	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.22	25	24	326	228	0.70	107	2	109	全木	228	プロセッサ	109	1,448	109	0	0	84	中					RC-0-80 120m	3m*10枚 190日 6m*10枚 190日	〃	10.4		
3062へ	水涵保	秋田スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.27	25	16	726	149	0.21	45	15	60	全木	149	プロセッサ	60	2,042	60	0	0	45	急							〃	11.0		
3062と	水涵保	秋田スギ	70	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.24	25	24	1,145	792	0.69	371	9	380	全木	792	プロセッサ	380	2,226	380	0	0	321	中							〃	11.2		
3062と1	水涵保	秋田スギ	70	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.11	25	24	1,653	1,142	0.69	534	12	546	全木	1,142	プロセッサ	546	1,637	546	0	0	466	中							〃	10.6		
3062ぬ	水涵保	秋田スギ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.31	25	24	629	432	0.69	202	4	206	全木	432	プロセッサ	206	2,015	206	0	0	169	緩							〃	11.0		
3062そ1	土流保	秋田スギ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.67	25	24	455	312	0.69	140	3	143	全木	312	プロセッサ	143	2,215	143	0	0	115	中							〃	11.4		
3062そ2	土流保	秋田スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.99	25	28	224	195	0.87	89	1	90	全木	195	プロセッサ	90	2,135	90	0	0	68	中							〃	11.3		
3062つ	土流保	秋田スギ	74	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.09	25	24	299	204	0.68	96	2	98	全木	204	プロセッサ	98	2,238	98	0	0	75	中							〃	11.4		
3062な1	水涵保	秋田スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.7	25	26	843	651	0.77	289	0	289	全木	651	プロセッサ	289	1,485	289	0	0	240	緩							〃	10.7		
3062な2	水涵保	秋田スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.91	25	26	164	126	0.77	56	0	56	全木	126	プロセッサ	56	1,242	56	0	0	38	緩					RC-0-80 90m	3m*5枚 190日 6m*5枚 190日	〃	10.4		
3062な6	水涵保	秋田スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.45	25	20	1,534	645	0.42	289	0	289	全木	645	プロセッサ	289	1,676	289	0	0	240	緩							〃	10.9		
3062な7	水涵保	秋田スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.9	25	20	657	276	0.42	123	0	123	全木	276	プロセッサ	123	1,549	123	0	0	96	緩							〃	10.7		
3062な8	水涵保	秋田スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.97	25	20	679	286	0.42	128	0	128	全木	286	プロセッサ	128	1,846	128	0	0	101	中							〃	11.0		
3064い	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.31	25	26	934	675	0.72	280	1	281	全木	675	プロセッサ	281	1,354	281	0	0	233	緩							〃	10.6		
3064い2	水涵保	秋田スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.53	25	16	216	45	0.21	19	0	19	全木	45	プロセッサ	19	1,323	19	0	0	19	緩							〃	10.5		
3064い3	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.37	25	16	559	116	0.21	49	0	49	全木	116	プロセッサ	49	1,571	49	0	0	33	緩							〃	10.8		

(様式6)


令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	秋田森林管理署
物件番号	3号
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(長内沢国有林外)



林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本	N m	L m	計 m	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全				土場 作 設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 (25%) ℓ	鉄板 規格*枚数
															方法	数量 m	方式	数量 m	フォワード 片道運搬距離 m	数量 m	グラブ付付きトラッ 片道運搬距離 m	数量 m	数量 m	林地傾 斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²							
3064い4	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.69	25	16	280	59	0.21	24	0	24	全木	59	プロセッサ	24	1,095	24	0	0	24	緩								仙北市役所 田沢湖庁舎	10.3	
3064は	水涵保	秋田スギ	70	保護伐	皆伐	1.27	100	18	2,805	639	0.23	356	64	420	全木	639	プロセッサ	420	1,644	420	0	0	381	急								〃	10.8	
3064ち	水涵保	秋田スギ	65	一般	皆伐	4.7	100	20	8,157	3,077	0.38	2,150	34	2,184	全木	3,077	プロセッサ	2,184	2,192	2,184	0	0	1,886	中								〃	11.4	
内田保内土場 (3062い)																													RC-0-80 90m²		3m*5枚 190日 6m*5枚 190日	〃	7.3	グラブ付付きトラック運搬先
合計						83.44			31,218	15,171	0.49	7,614	186	7,800		15,171		7,800		7,800		2,280	6,940		5,560		バックホウ 0.45m³ 120h	RC-0-80 420m²	(一般材・合板 9,252L 2,570m²)	3m*50枚 190日 6m*40枚 190日				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20°、中:20° ～30°、急:30° 以上

製品生産及び森林環境保全整備事業（長内沢国有林外）

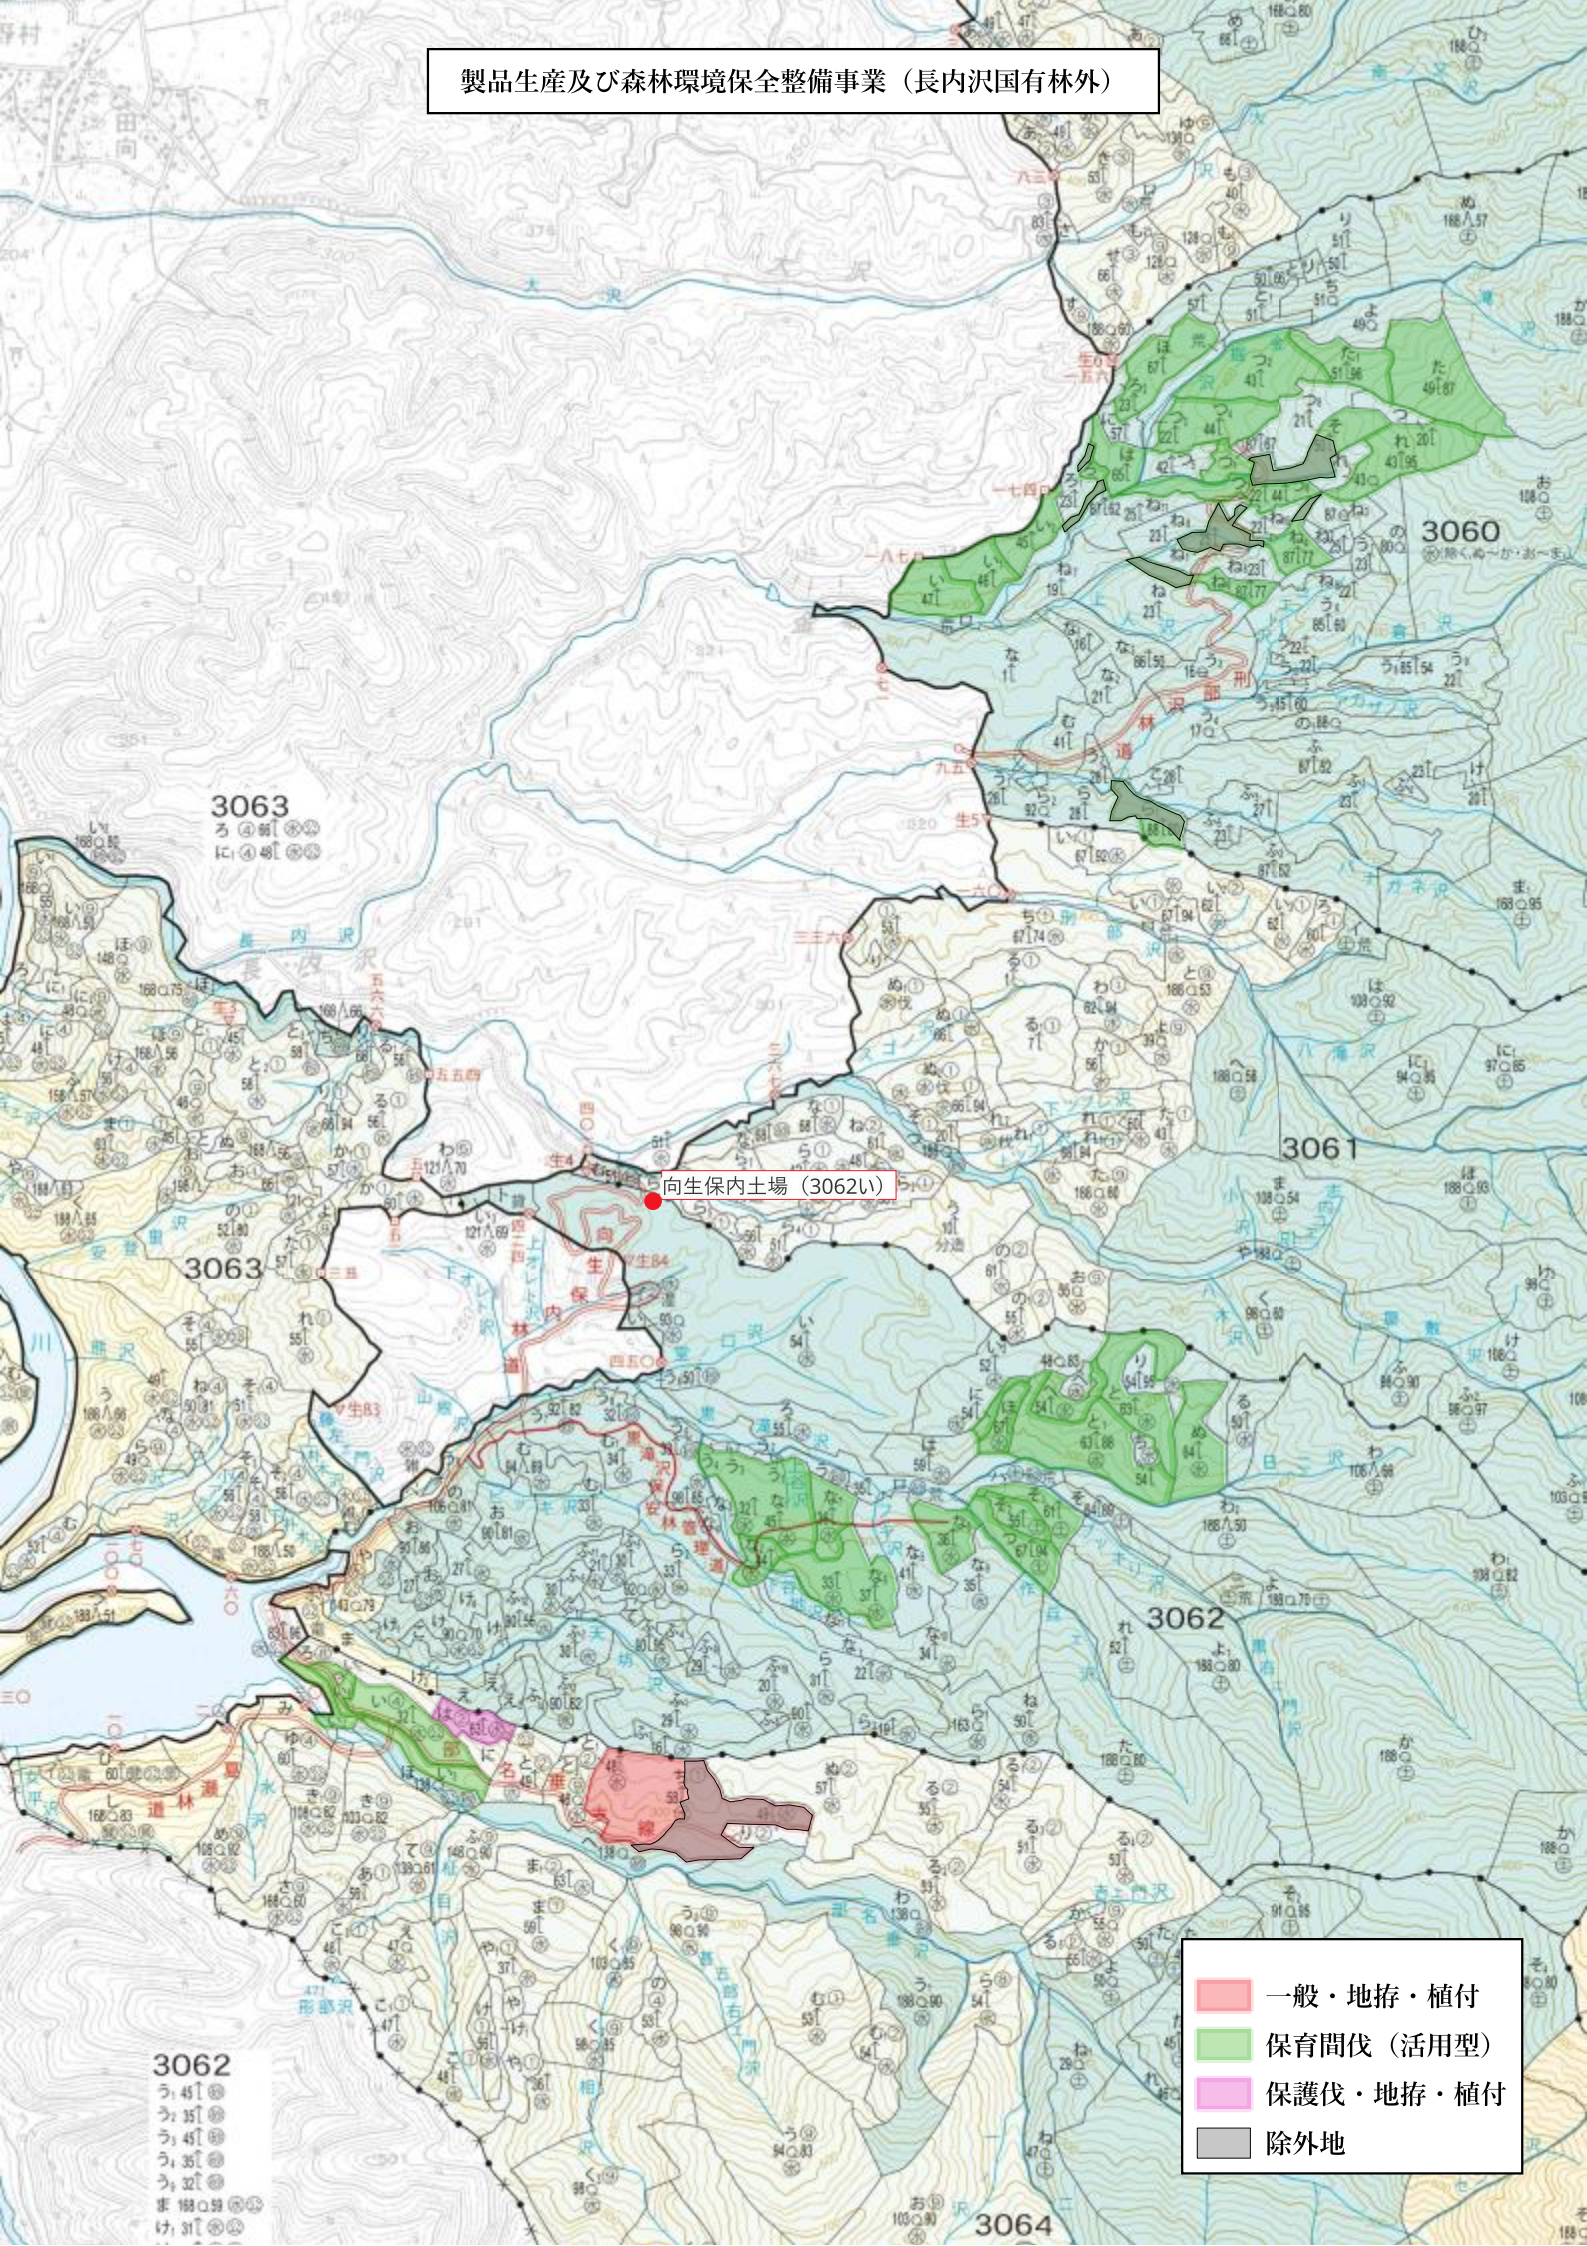

製品生産及び森林環境保全整備事業作業計画図

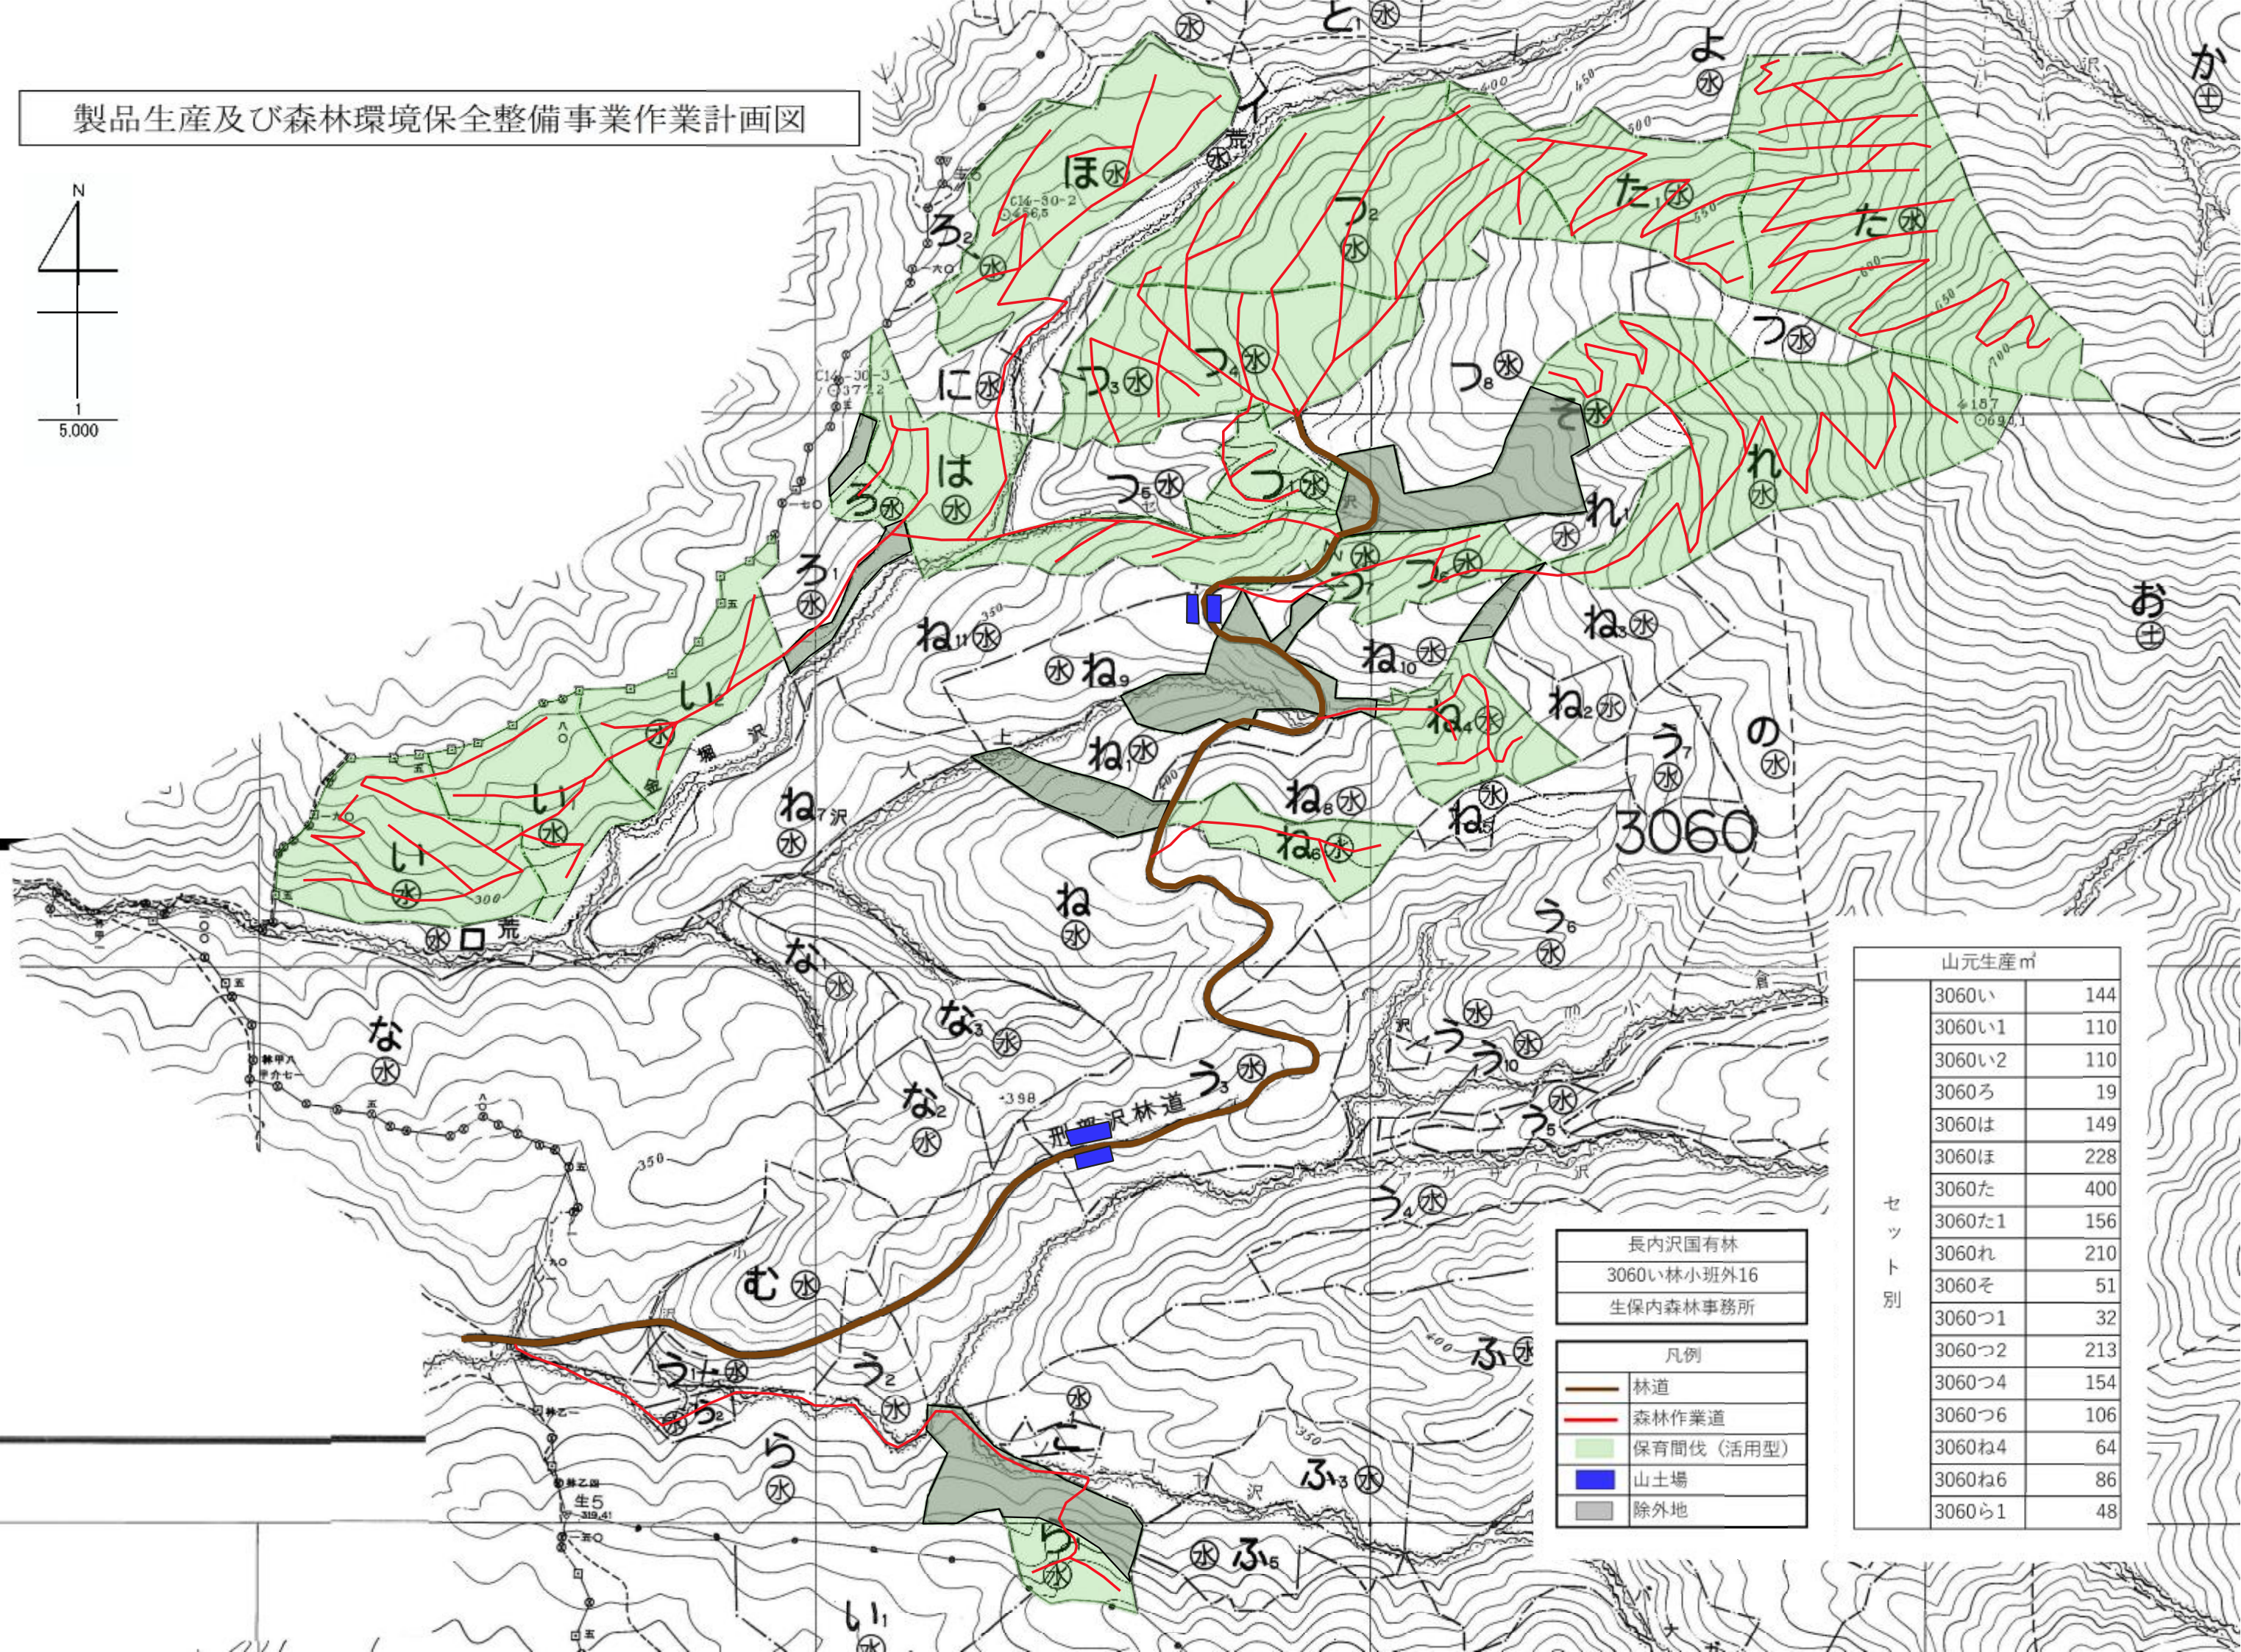


山元生産㎡		
セ ッ ト 別	3060い	144
	3060い1	110
	3060い2	110
	3060ろ	19
	3060は	149
	3060ほ	228
	3060た	400
	3060た1	156
	3060れ	210
	3060そ	51
	3060つ1	32
	3060つ2	213
	3060つ4	154
	3060つ6	106
	3060ね4	64
3060ね6	86	
3060ら1	48	

長内沢国有林	
3060い林小班外16	
生保内森林事務所	

凡例	
	林道
	森林作業道
	保育間伐（活用型）
	山土場
	除外地

製品生産及び森林環境保全整備事業作業計画図

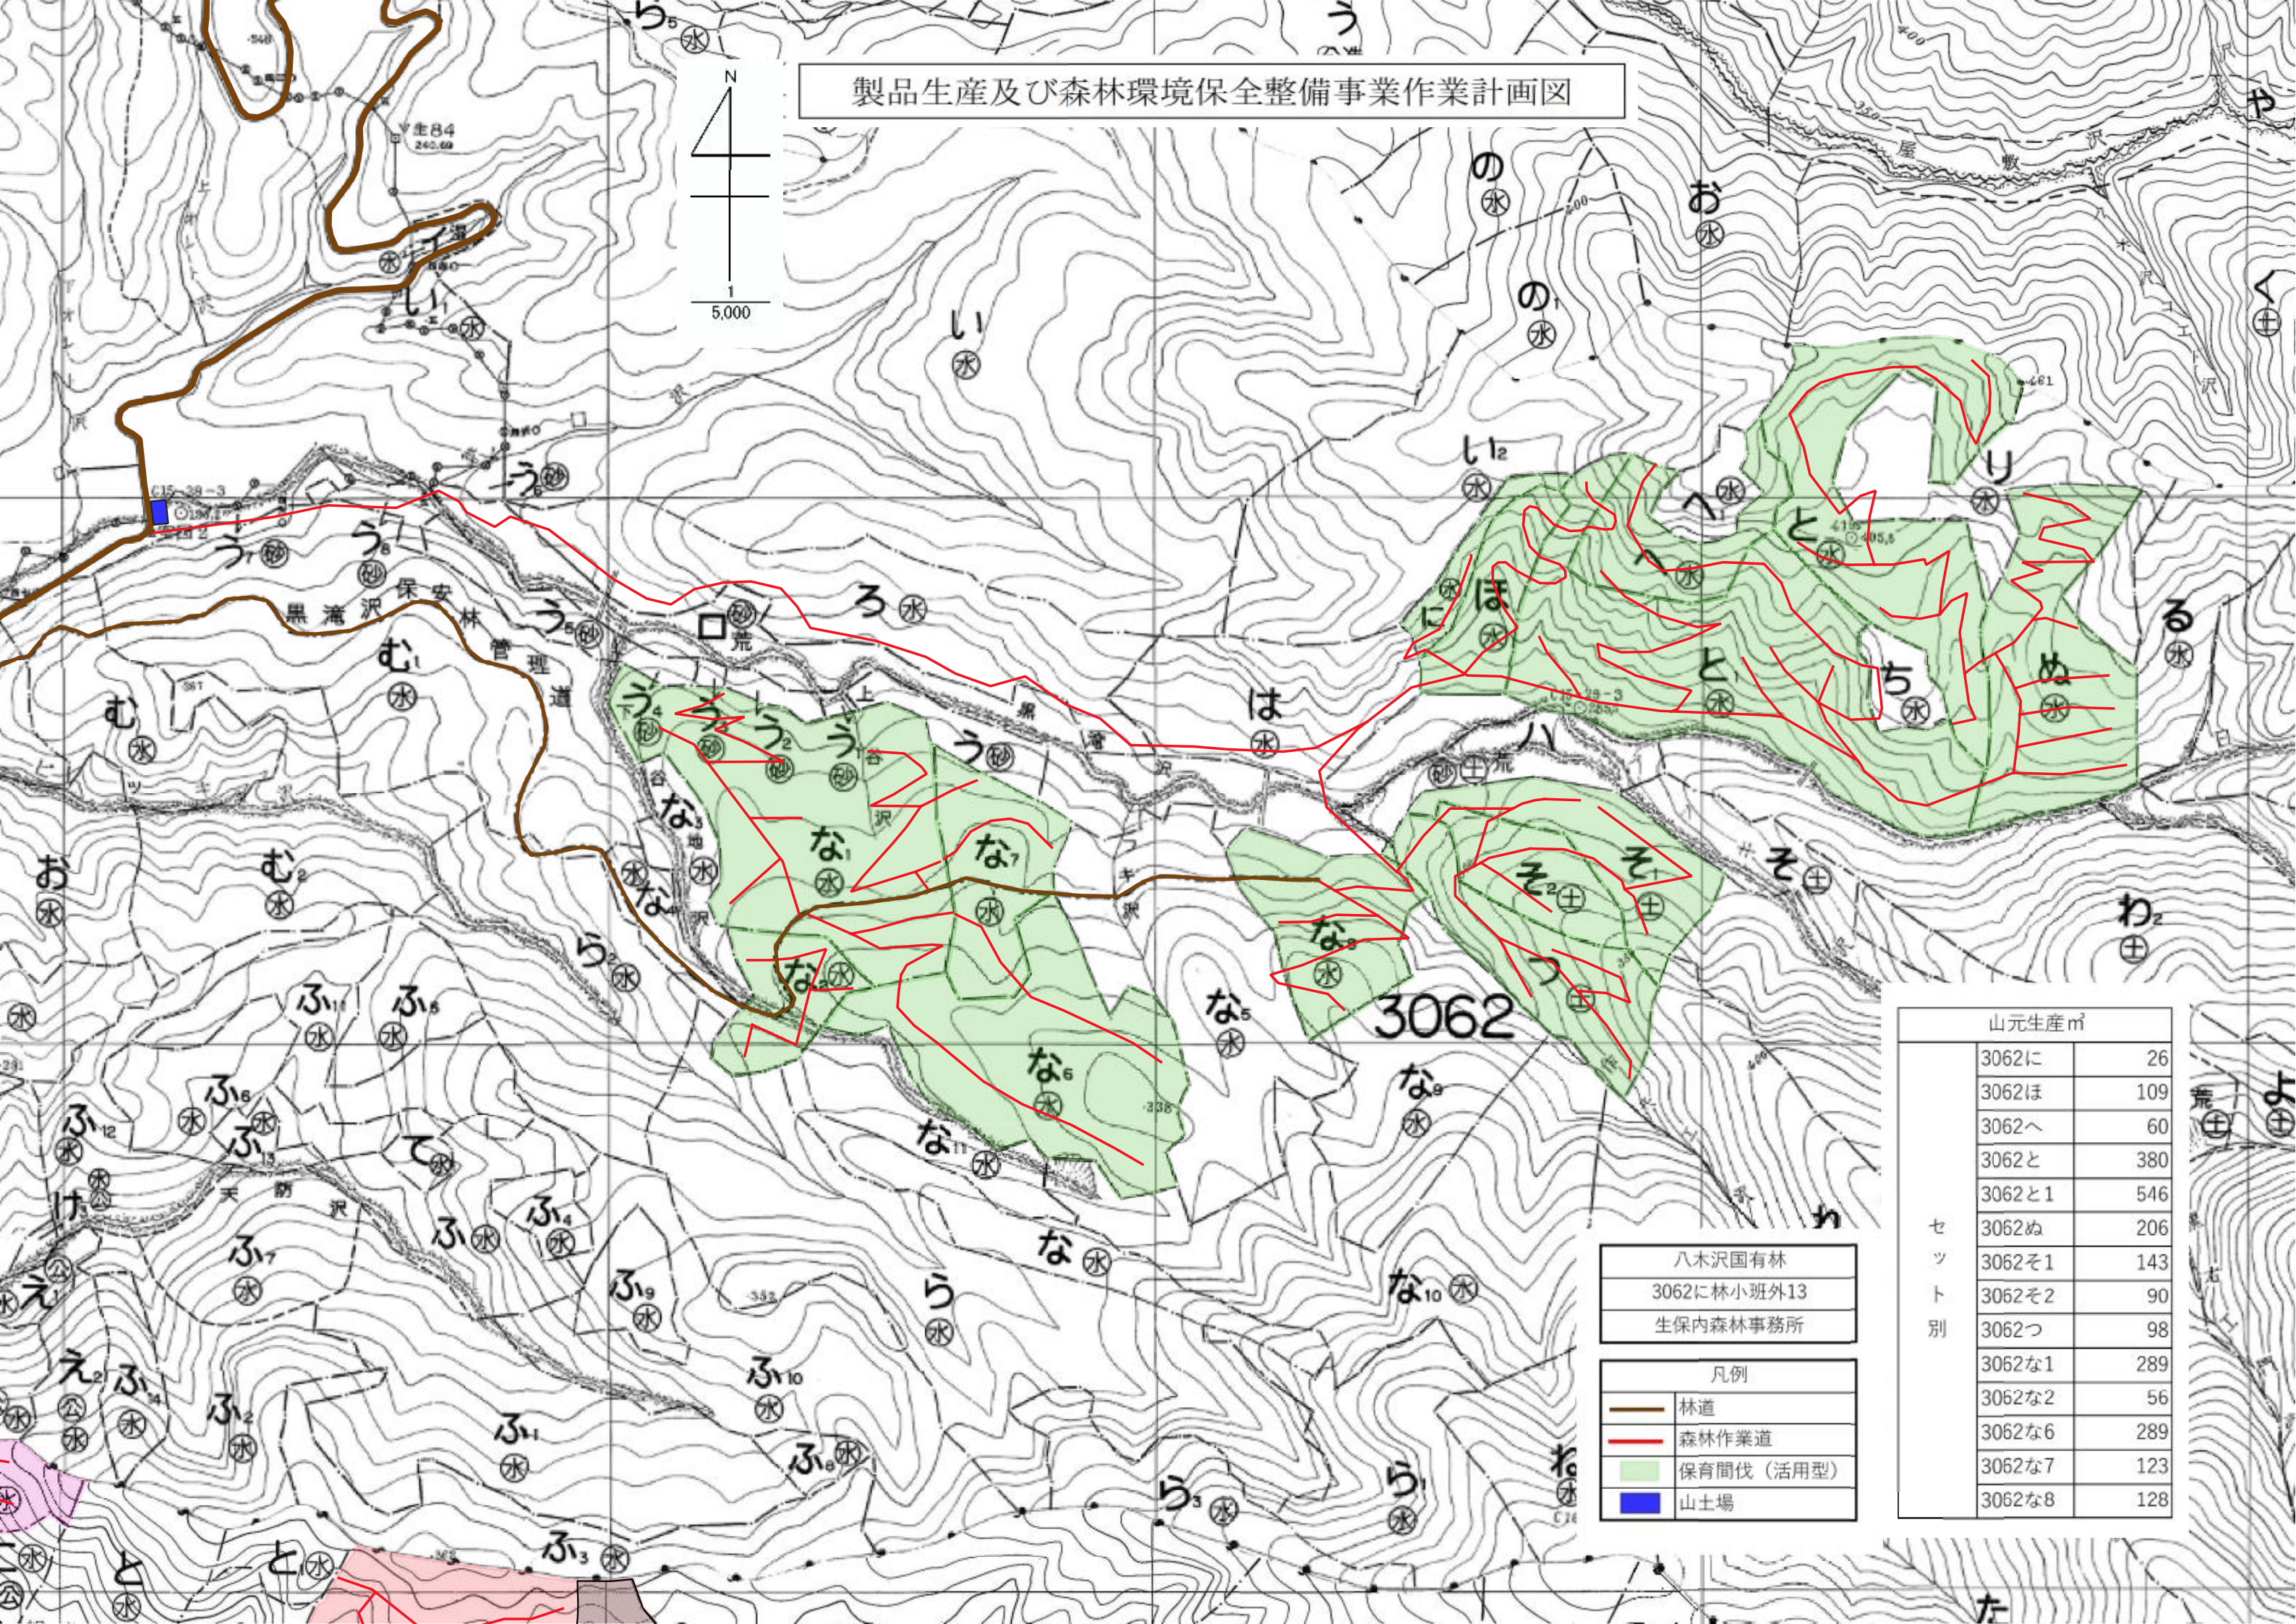

八木沢国有林
3062に林小班外13
生保内森林事務所

凡例	
	林道
	森林作業道
	保育間伐（活用型）
	山土場

山元生産㎡		
セ ッ ト 別	3062に	26
	3062ほ	109
	3062へ	60
	3062と	380
	3062と1	546
	3062ぬ	206
	3062そ1	143
	3062そ2	90
	3062つ	98
	3062な1	289
	3062な2	56
	3062な6	289
	3062な7	123
	3062な8	128

製品生産及び森林環境保全整備事業作業計画図



部名垂沢国有林
3064い林小班外5
生保内森林事務所

凡例	
	林道
	森林作業道
	一般・地拵・植付
	保育間伐（活用型）
	保護伐・地拵・植付
	山土場
	除外地

山元生産㎡		
セ ツ ト 別	3064い	28
	3064い2	19
	3064い3	49
	3064い4	2
	3064は	42
	3064ち	218
