

(様式6)

令和7年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署		米代西部森林管理署																																	
物件番号		6号		事業期間		契約締結日の翌日		～		R7.12.19																									
物件名		製品生産及び森林環境保全整備事業(大沢山、寺ノ沢国有林)																																	
林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離 km				一貫作業	
									本数	材積	立木1本当たり材積	N	L	計	伐削		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布	鉄板規格×枚数(日数)						
															方法	数量	方式	数量	フォワード片道運搬距離	数量	グラブブル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	編柵	緑化	バット約0.45	C-80				スミバイン			
1									2071ほ	干害保	スギ	116	経常	定性間伐	1.86	23	36	230	323	1.40	170	11	181	全木	181	アビチ	181	297	181	1,300	181	急			
2	2072い	干害保	スギ	62	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	11.96	25	30	3,131	3,153	1.01	1,634	5	1,639	全木	3,153	アビチ	1,639	696	1,639	1,300	1,639	急				80	300		6m×80枚(210日間)	井川町役場	13.3		
3	2072ろ	干害保	スギ	61	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	5.24	25	30	1,369	1,382	1.01	661	3	664	全木	1,382	アビチ	664	360	664	1,300	664	急									井川町役場	13.3	
4	2072は	干害保	スギ	114	経常	定性間伐	3.71	22	46	363	791	2.18	443		443	全木	443	アビチ	443	368	443	1,300	443	急									井川町役場	13.3	
5	2072れ	干害保	スギ	69	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	6.54	25	40	786	1,396	1.78	694	32	726	全木	1,396	アビチ	726	197	726	1,300	726	中									井川町役場	13.3	
6	2072そ	干害保	スギ	74	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	2.27	25	34	502	565	1.12	283	33	316	全木	565	アビチ	316	509	316	1,300	316	急									井川町役場	13.3	
7	2072つ	干害保	スギ	87	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	0.23	25	36	54	70	1.29	39		39	全木	70	アビチ	39	25	39	1,300	39	中									井川町役場	13.3	
8	2072ぬ	干害保	スギ	65	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	2.03	25	36	284	388	1.37	202		202	全木	388	アビチ	202	313	202	1,300	202	急									井川町役場	13.3	
9	2072な	干害保	スギ	74	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	1.52	25	32	332	378	1.14	190	22	212	全木	378	アビチ	212	498	212	1,300	212	急									井川町役場	13.3	
10	2072ろ	干害保	スギ	69	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	3.82	25	40	464	815	1.76	405	18	423	全木	815	アビチ	423	625	423	1,300	423	急									井川町役場	13.3	
11	2073と	干害保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	4.62	25	20	1,592	712	0.45	255	1	256	全木	712	アビチ	256	242	256	1,800	256	中									井川町役場	13.8	
12	2073と1	干害保	スギ	56	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	0.40	25	22	145	78	0.54	32	3	35	全木	78	アビチ	35	69	35	1,800	35	中									井川町役場	13.8	
13	2073と2	干害保	スギ	38	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	2.75	25	20	946	424	0.45	152	1	153	全木	424	アビチ	153	460	153	1,800	153	中									井川町役場	13.8	
14	2073と3	干害保	アカマツ	117	経常	定性間伐	2.55	23	32	528	514	0.97	288		288	全幹	288	パゾー	288	691	288	1,800	288	急									井川町役場	13.8	
15	2073ち	干害保	スギ	58	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3株)	12.51	25	20	3,510	1,488	0.42	578	136	714	全木	1,488	アビチ	714	461	714	1,800	714	中				20	100		6m×40枚(210日間)	井川町役場	13.8		
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
小計						62.01				14,236	12,475		6,026	265	6,291		11,759		6,291		6,291		6,291				100	400					【検知一括】6291 m3		
合計						62.01				14,236	12,475		6,026	265	6,291		11,759		6,291		6,291		6,291		13.050		100	400	44						

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。


緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度


位置図

大沢山、寺ノ沢国有林

(1 : 20,000)

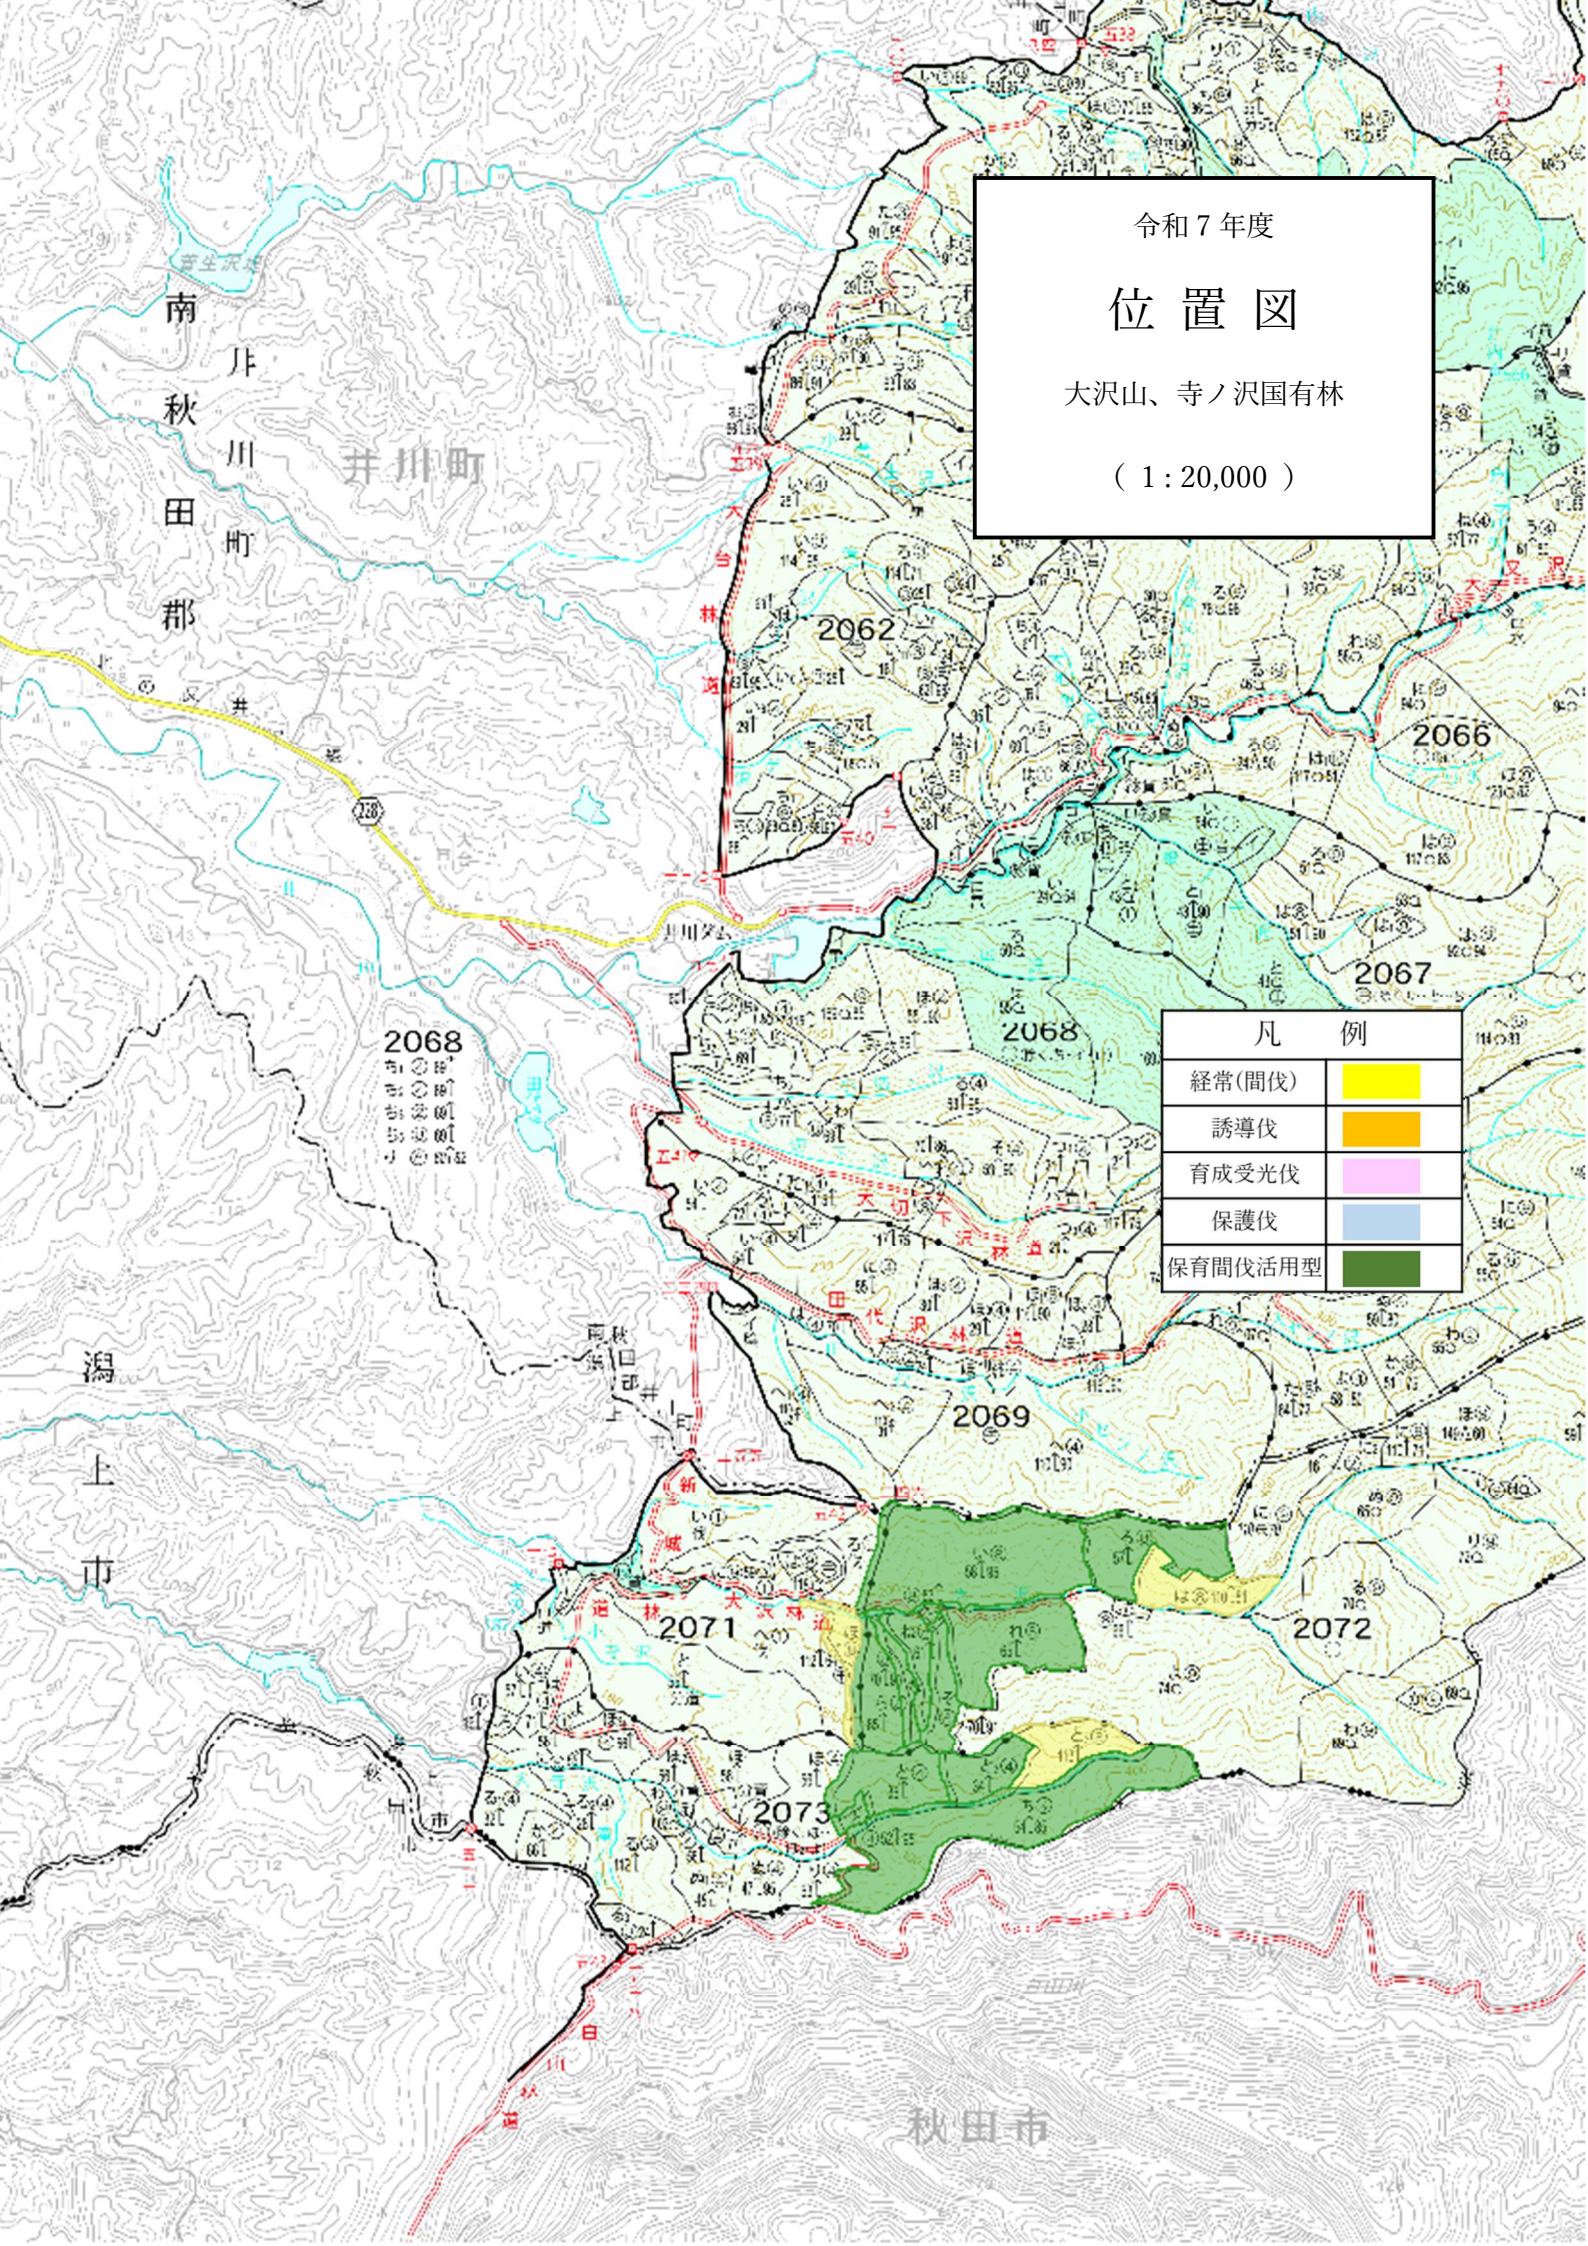

令和7年度
作業計画図
大沢山、寺ノ沢国有林
(1:5,000)

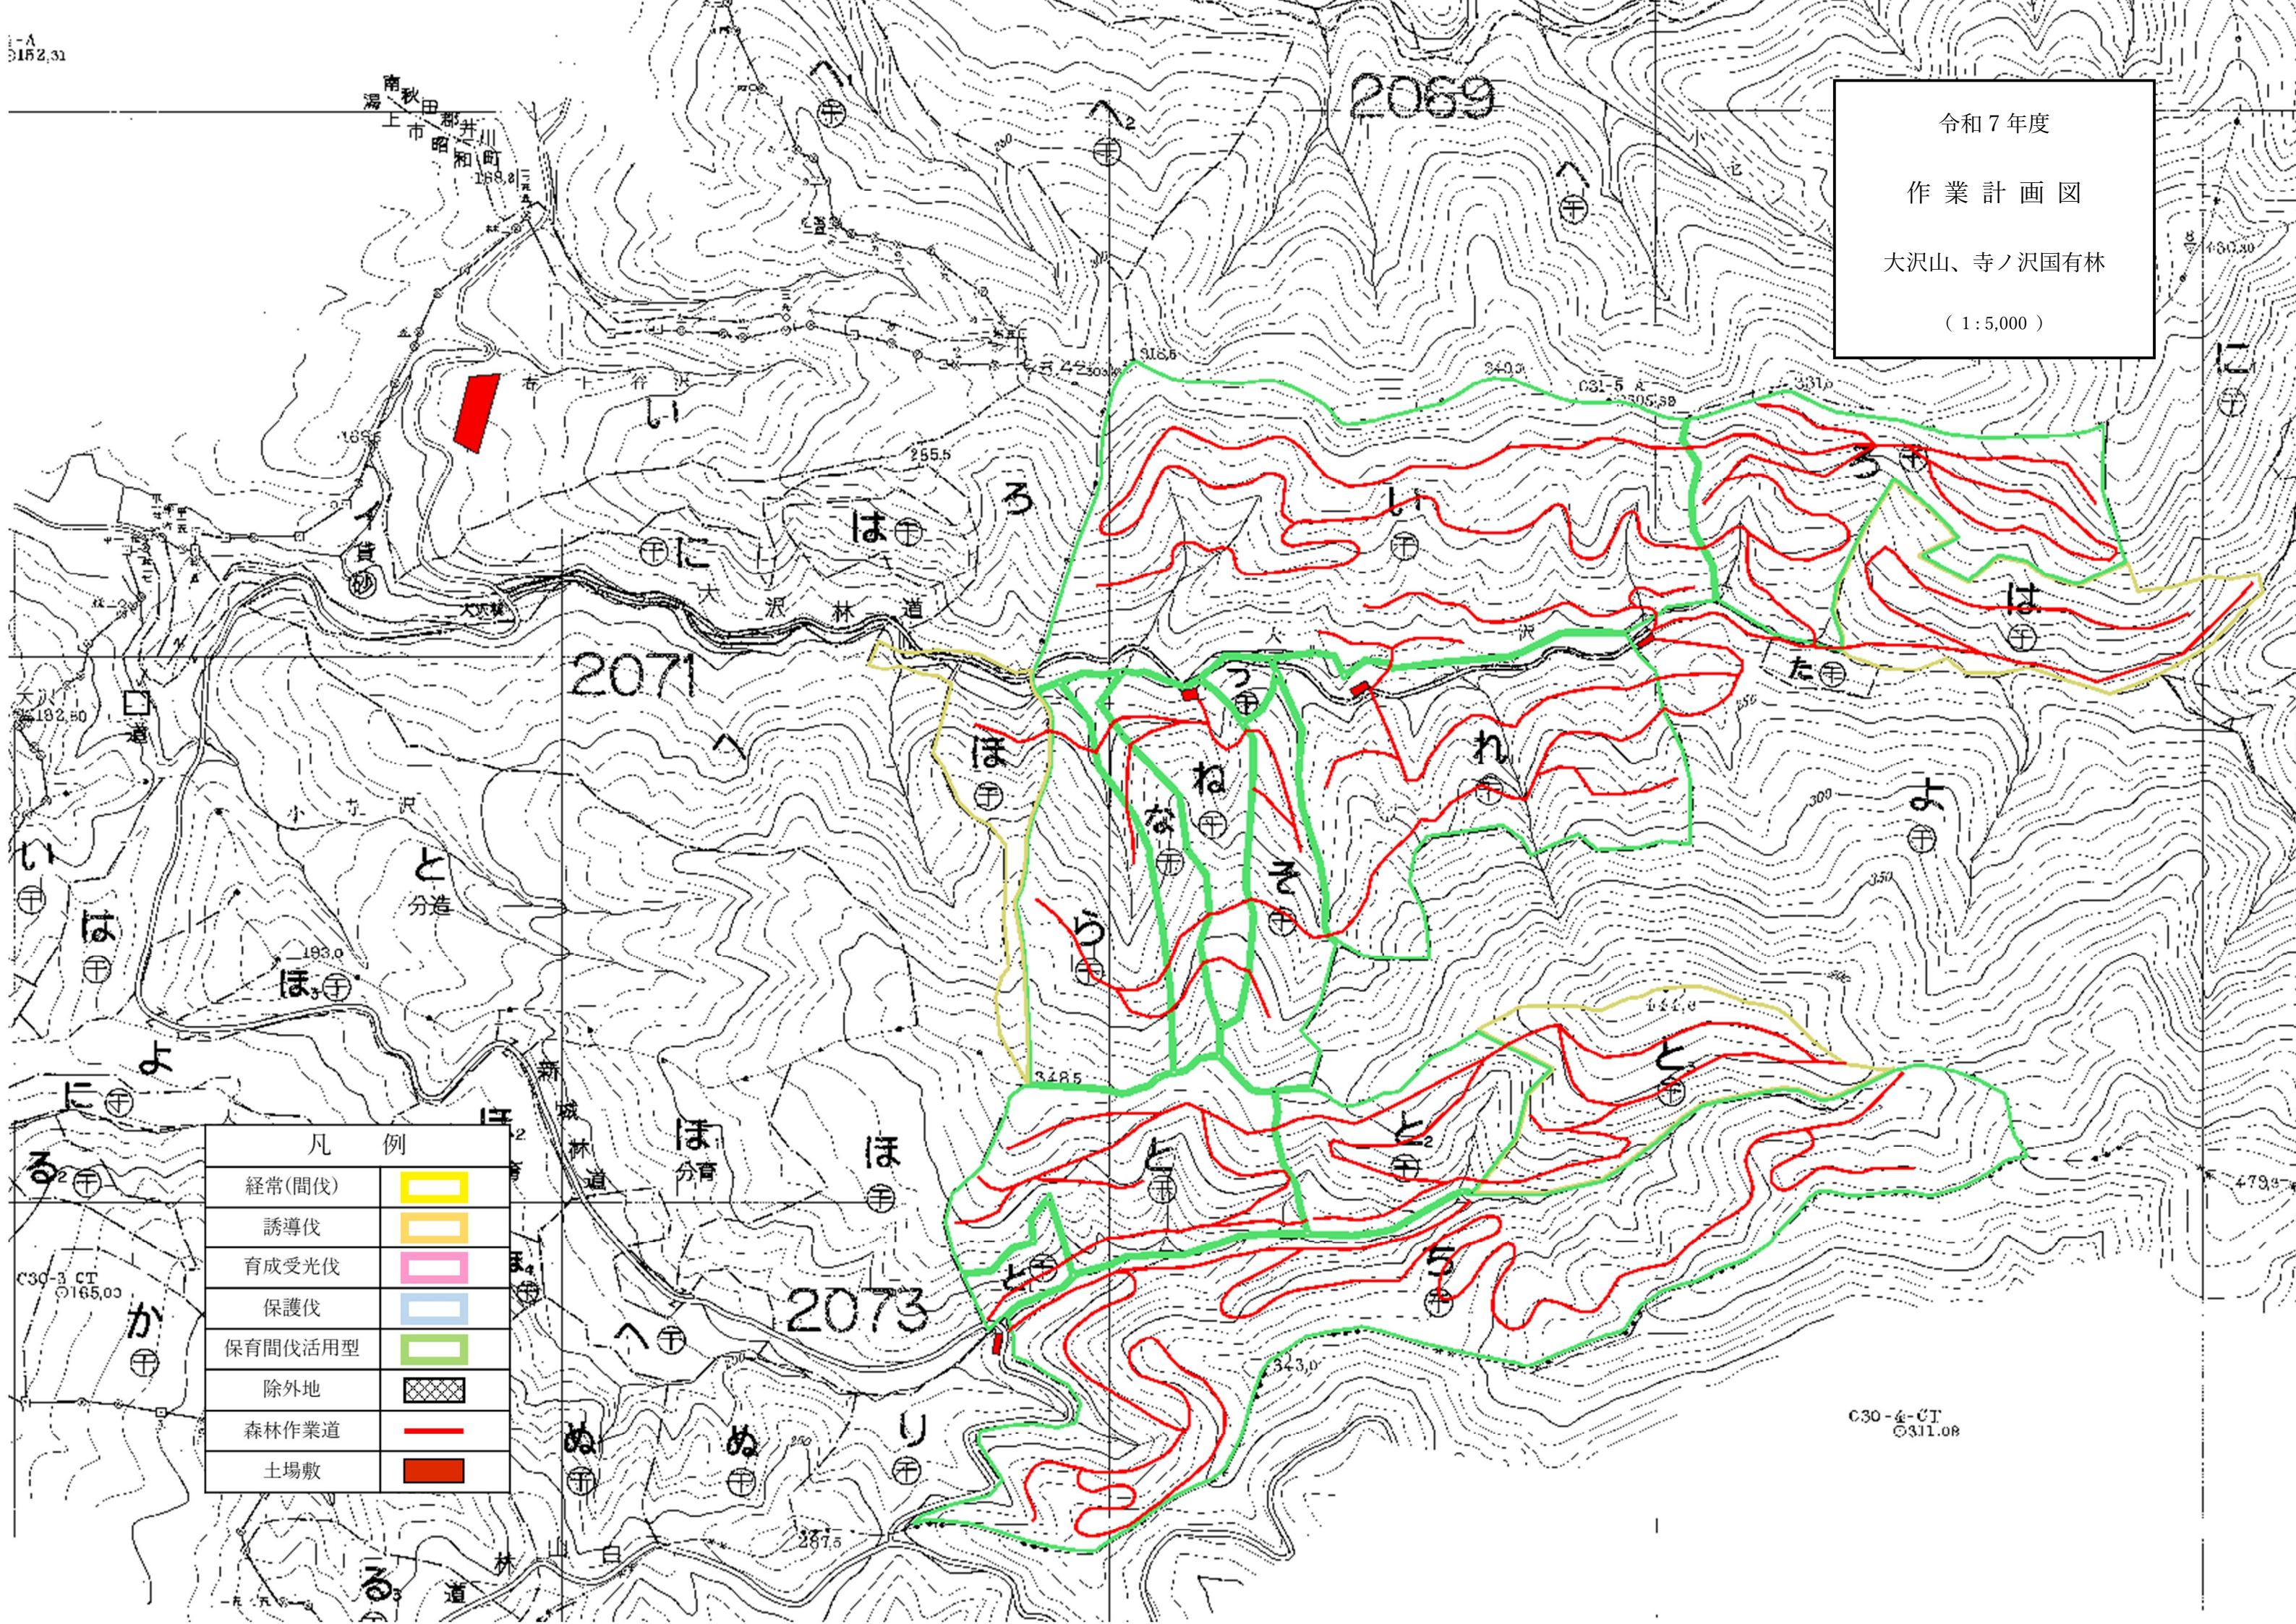

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

C30-4-CT
311.08
